

昭和五年度直轄工事年報

內務省土木局

正 誤 表				頁
一一	一	▲	八〇〇 ハ、〇 ハ、〇	一一
一二	一	■	三〇 三、七	一二
一三	一八	●	一三〇、二五五 第一箇所	一三
一六	九	竣功	第一箇所	一六
一七	一二	直轄施行	直接施行	一七
一八	一四	小石樋管	小石和樋管	一八
一九	三	脚寄	堤脚寄	一九
二〇	六	中掘第二水制	中掘第二水制	二〇
二一	一四	五年	五年	二一
二二	九	暗礁	暗礁	二二
二三	八	四越五	四越五	二三
二四	一二	主生産物	主生産物	二四
二五	二	維持工事	河口維持工事	二五
二六	二	河口工事	河口工事	二六
二七	二	河口工事	河口工事	二七

二一三頁ト二一四頁トハ本文全部前後ノコト

昭和五年度直轄工事年報目次

總論

第一	治水事業……………	一頁
第二	港灣改良事業……………	六
第三	復舊及補修事業……………	七
第四	本年度施行工事……………	八
第五	竣功工事……………	一三

第一章 河川改修工事

第一	利根川改修工事……………	一七
第二	荒川改修工事……………	三七
第三	北上川改修工事……………	五三
第四	阿賀野川改修工事……………	六一
第五	最上川改修工事……………	六九

目次

二

第六	江合、鳴瀬兩川改修工事	七九頁
第七	雄物川改修工事	八五
第八	淀川改修増補工事	九一
第九	多摩川改修工事	一〇三
第一〇	千曲川改修工事	一〇九
第一一	加古川改修工事	一一七
第一二	神通川改修工事	一二五
第一三	岩木川改修工事	一三五
第一四	太田川改修工事	一四二
第一五	阿賀川及阿武隈川改修工事	一四七
第一六	圓山川改修工事	一五五
第一七	富士川改修工事	一六三
第一八	木曾川上流改修工事	一七一
第一九	斐伊川改修工事	一八一

第二〇	信濃川上流改修工事	一八九
第二一	天龍川改修工事	一九五
第二二	千代川改修工事	一九九
第二三	蘆田川改修工事	二〇五
第二四	紀ノ川改修工事	二一一
第二五	筑後川改修工事	二一七
第二六	緑川改修工事	二二三
第二七	北川改修工事	二二七
第二八	旭川改修工事	二三三
第二九	鬼怒川改修工事	二三九
第三〇	大淀川改修工事	二四九
第三一	狩野川改修工事	二五五
第三二	那賀川改修工事	二五九
第三三	大野川改修工事	二六五

第三四	渡川改修工事	二六九
-----	--------	-----

第三五	木津川改修工事	二七三
-----	---------	-----

第二章 河川附屬物及水路維持工事

第一	木曾川附屬物及水路維持工事	二七九
----	---------------	-----

第二	淀川附屬物及水路維持工事	二八三
----	--------------	-----

第三	利根、渡良瀬兩川維持工事	二八七
----	--------------	-----

第四	信濃川維持工事	二九五
----	---------	-----

第五	荒川維持工事	二九九
----	--------	-----

第三章 砂防工事

第一	淀川流域砂防工事	三〇三
----	----------	-----

第二	富士川流域砂防工事	三〇七
----	-----------	-----

第三	桂川流域砂防工事	三一
----	----------	----

第四	千曲川流域砂防工事	三一三
----	-----------	-----

第五	鬼怒川流域砂防工事	三一九
----	-----------	-----

第六	神通川流域砂防工事	三三三
第七	常願寺川流域砂防工事	三三七
第八	手取川流域砂防工事	三三一
第九	揖斐川流域砂防工事	三三五
第一〇	木津川流域砂防工事	三三九

第四章 港灣改良工事

第一	關門海峽改良工事	三四一
第二	鹽釜港修築工事	三五一
第三	神戸港修築工事	三五七
第四	門司港修築工事	三六七
第五	橫濱港修築工事	三七三
第六	清水港修築工事	三八三
第七	敦賀港修築工事	三九一
第八	境港修築工事	三九七

第九	小松島港修築工事	四〇三頁
第一〇	今治港修築工事	四一
第一一	鹿兒嶋港修築工事	四一九
第一二	伏木港修築工事	四二五
第一三	土崎港修築工事	四三一
第一四	小名濱港修築工事	四三五
第一五	宮古港修築工事	四三九
第一六	浦戸港修築工事	四四三
第一七	七尾港修築工事	四四七
第一八	尾道港修築工事	四五一
第一九	舞鶴港修築工事	四五五
第二〇	博多港修築工事	四五九
第五章	復舊工事及補修工事	
第一	相模川外四箇川流域震災復舊砂防工事	四六三

第二 信濃川補修工事.....

四七五


口繪寫眞(三十面)

- 1 利根川第二期改修工事小野川水門洪水時ノ狀況
- 2 荒川上流改修工事ディーゼル掘鑿機及機關車操業狀況
- 3 北上川改修工事飯野川可動堰全景
- 4 北上川改修工事飯野川可動堰ノ轉堰及固定堰
- 5 北上川改修工事脇谷閘門
- 6 北上川改修工事柳津水門
- 7 北上川改修工事河口突堤
- 8 最上川改修工事高谷地樋門
- 9 最上川改修工事中央突堤方塊沈設作業
- 10 最上川改修工事支川赤川筋三川橋
- 11 神通川改修工事東突堤頭部用浮函ノ進水
- 12 富士川改修工事加島水制
- 13 木曾川上流改修工事福壽護岸
- 14 木曾川上流改修工事日置江築堤

目次

目次

15	木曾川上流改修工事平野井川樋門
16	千代川改修工事鳥取市下流新川通水前狀況
17	千代川改修工事鳥取市下流新川通水後狀況
18	千曲川流域砂防工事横湯川筋山腹工
19	常願寺川流域砂防工事白岩舊堰堤及上流左岸護岸
20	手取川流域砂防工事甚之助谷第九號堰堤
21	手取川流域砂防工事柳谷第八號堰堤
22	横濱港修築工事外防波堤用函塊
23	横濱港修築工事表高島町物揚杭打作業
24	神戸港修築工事兵庫第二突堤
25	鹿兒島港修築工事南防波堤
26	相模川流域震災復舊砂防工事長者堰堤
27	信濃川補修工事可動堰
28	信濃川補修工事固定堰
29	信濃川補修工事第二床固
30	信濃川補修工事第二床固阻柱

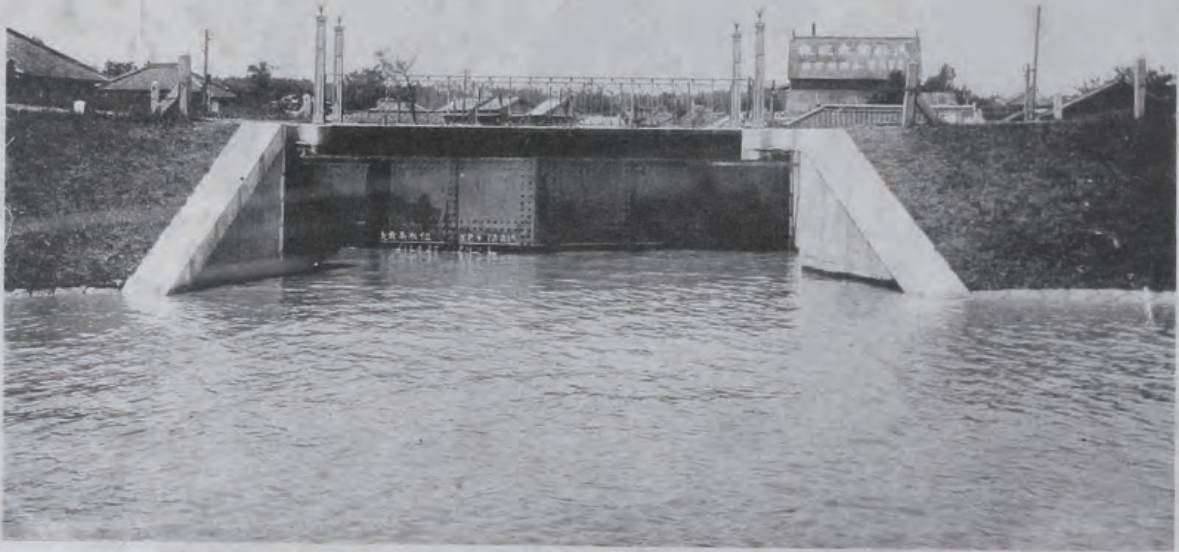

(1) 利根川第二期改修工事小野川水門洪水時ノ狀況

(千葉縣佐原町地先)

水門徑間六米、昭和五年八月三日ノ
洪水ハ殆ド計畫高水位ニ達シタリ



(2) 荒川上流改修工事ディーゼル掘鑿機及機關車操業狀況

(埼玉縣入間郡植木村地先)


掘鑿機ハ梯形十時間一千二百立方米掘五十馬力ディーゼル機關
ヲ備フ、機關車ハ重量二十噸、百十馬力ディーゼル機關ヲ備フ



(3) 北上川改修工事飯野川可動堰全景

(宮城縣桃生郡飯野川町地先)

水通幅十七米、低水路ハ四連、高水敷ハ十七連ヨリ成ル

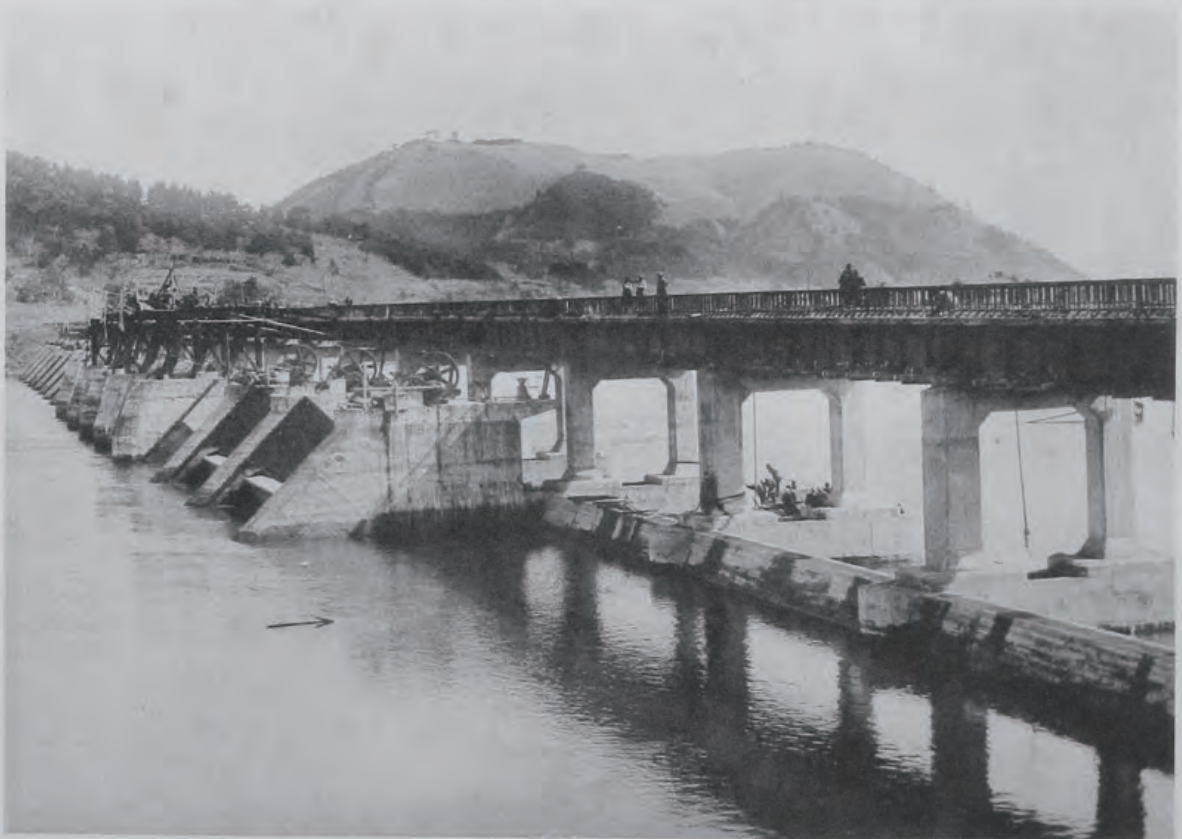

(4) 北上川改修工事飯野川可動堰ノ轉堰及固定堰

(宮城縣桃生郡飯野川町地先)


高水敷ノ内左岸一連及右岸四連ハ固定堰、其他ハ凡テ轉堰ナリ



(5) 北上川改修工事協谷閘門

(宮城縣桃生郡桃生村地先)

閘門幅七米九、長五十八米、上下二段ノ引揚扉使用

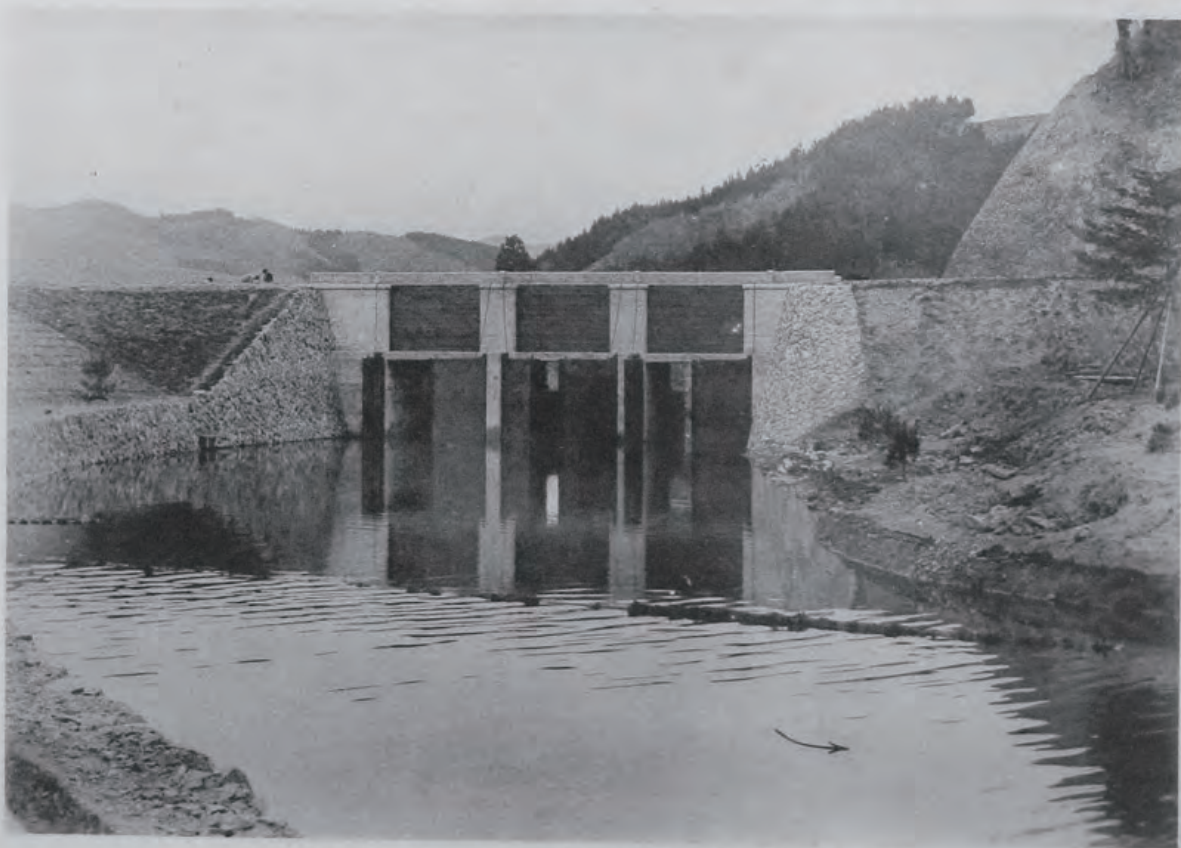


(6) 北上川改修工事柳津水門

(宮城縣本吉郡柳津町地先)

水門幅三米七、高三米九三連、鐵製合掌扉使用




(7) 北 上 川 改 修 工 事 河 口 突 堤
(宮城縣牡鹿郡石巻町地先)

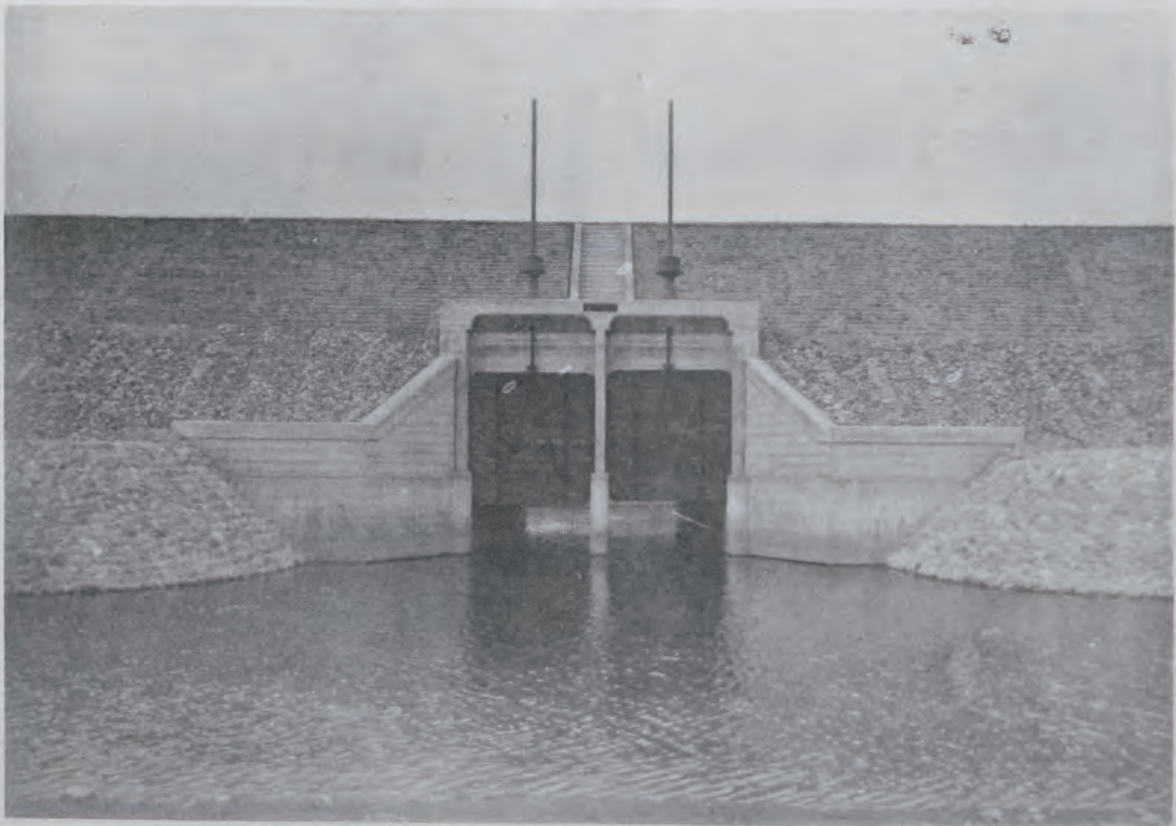

(8) 最 上 川 改 修 工 事 高 谷 地 樋 門
(山形縣飽海郡上郷村地先)

鐵筋混凝土造、高二米三、幅二米三 二連、引揚扉使用

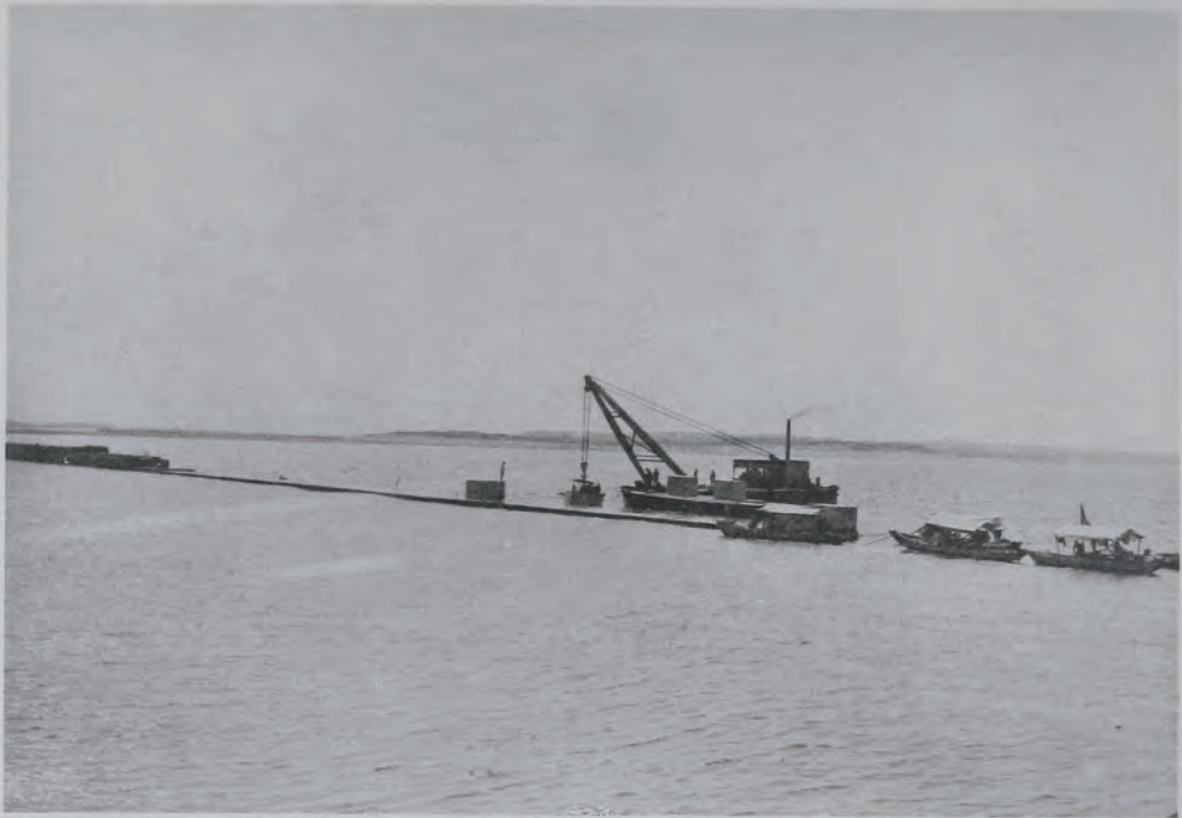

(9) 最上川改修工事中央突堤方塊沈設作業
(山形縣飽海郡酒田町地先)



(10) 最上川改修工事支川赤川筋三川橋
(山形縣鶴岡市大字大寶寺地先)

長三百十四米、有効幅員六米四、鈑桁徑間二十七米五連
徑間二十一米二連、鐵筋混凝土桁徑間十一米十二連



(11) 神通川改修工事東突堤頭部用浮函ノ進水
 (富山縣上新川郡東岩瀬町地先)
 浮函長七米、幅三米五、高二米五




(12) 富士川改修工事加島水制
 (静岡縣富士郡富士町富下地先)
 長二十四米、直高六米八、頂部ハ計畫高水位、周圍根固ハ混
 凝土方格柵、法面及天端割石張、法勾配兩側二割、頭部三割



(13) 木曾川上流改修工事福壽護岸
 (岐阜縣羽島郡福壽村地先)
 法面石張、根固單床



(14) 木曾川上流改修工事日置江築堤
 (岐阜縣稻葉郡日置江村地先)

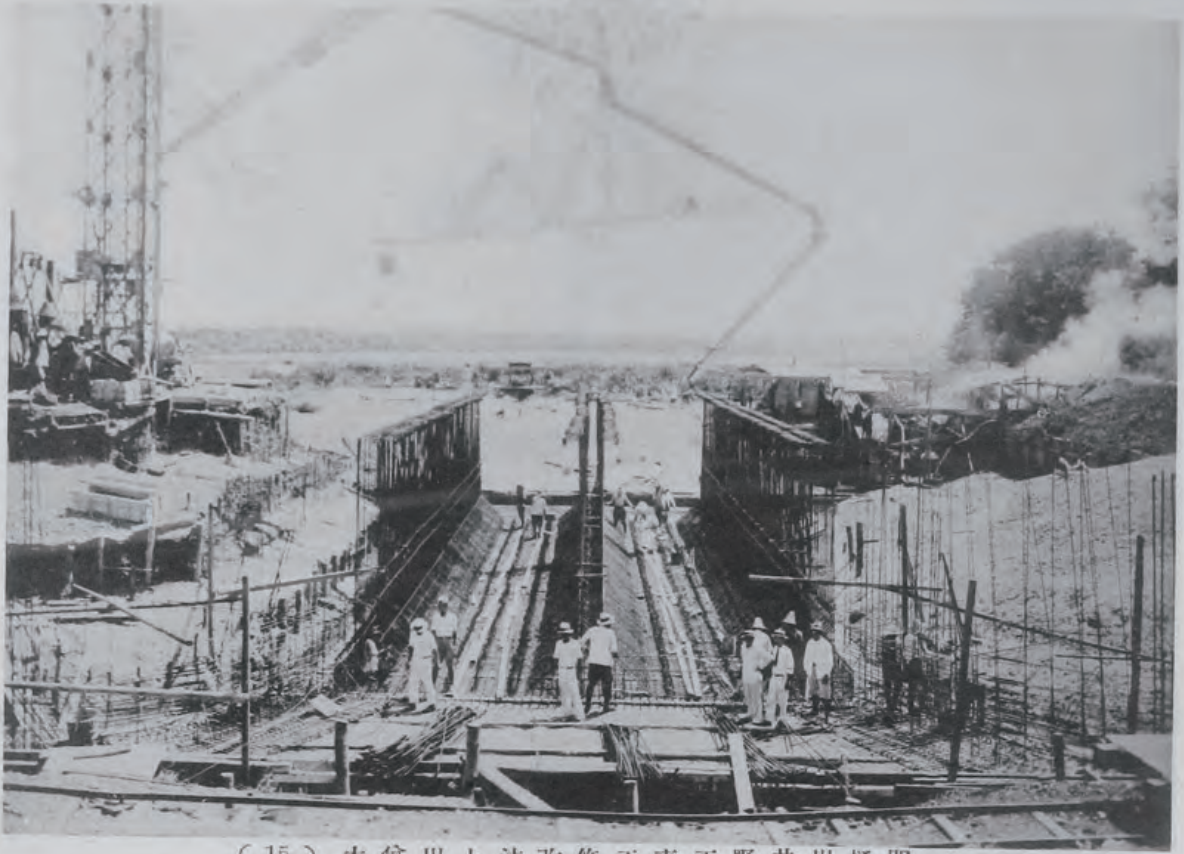

(15) 木曾川上流改修工事平野井川樋門

(岐阜縣安八郡和合村地先)


鐵筋混凝土造、高三米五、幅三米五、長二十二米二連

混凝土配給塔高二十五米、シュート長三十四米



(16) 千代川改修工事鳥取市下流新川通水前狀況

(鳥取縣氣高郡千代水村地先)

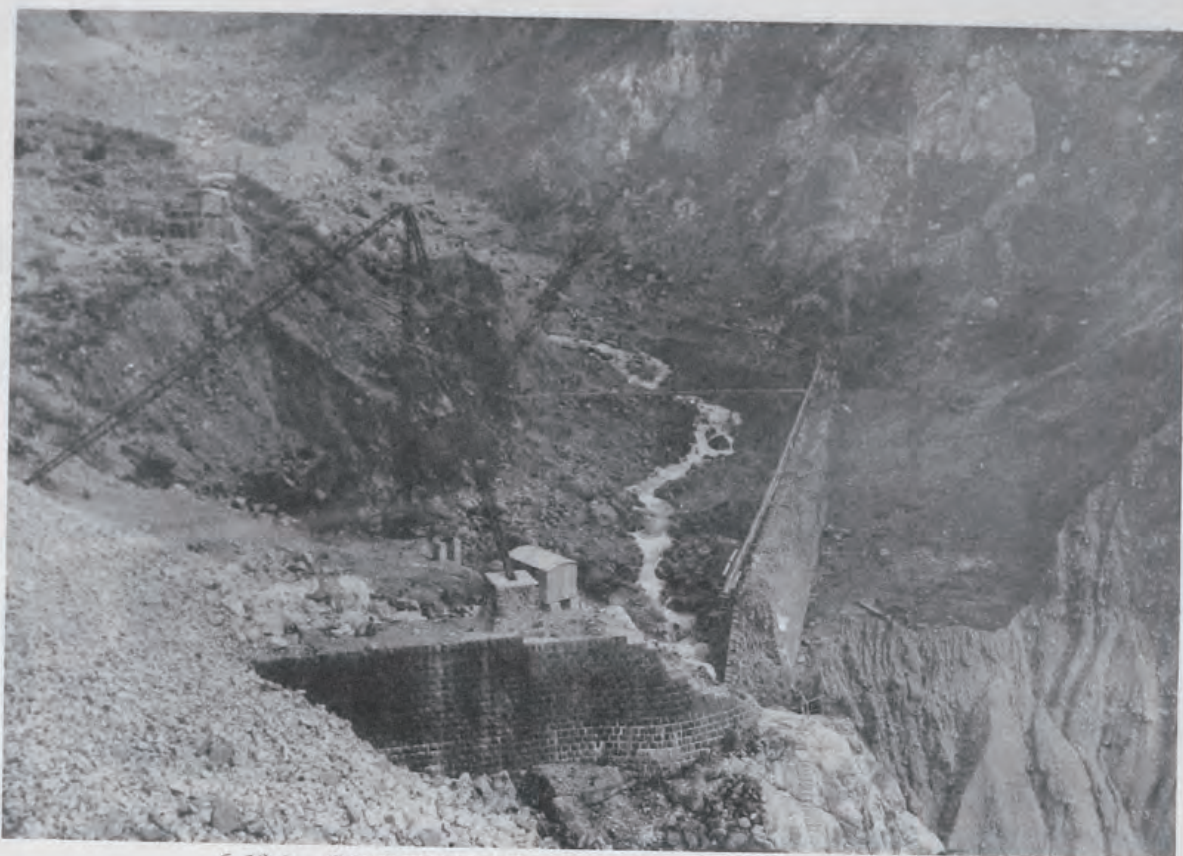

(19) 常願寺川流域砂防工事白岩舊堰堤及上流左岸護岸
(富山縣上新川郡大山村及中新川郡立山村地先)



(20) 手取川流域砂防工事甚之助谷第九號堰堤
(石川縣能美郡白峰村地先)
全長三十二米、立積六百九十立方米




(21) 手取川流域砂防工事柳谷第八號堰堤
(石川縣能美郡白峰村地先)

昭和五年七月十日出水後ノ狀況



(22) 横濱港修築工事外防波堤用函塊
高八米七、上部幅五米、底部幅九米、長十二米、
混凝土立積三百十七立方米、重量七百七十五噸

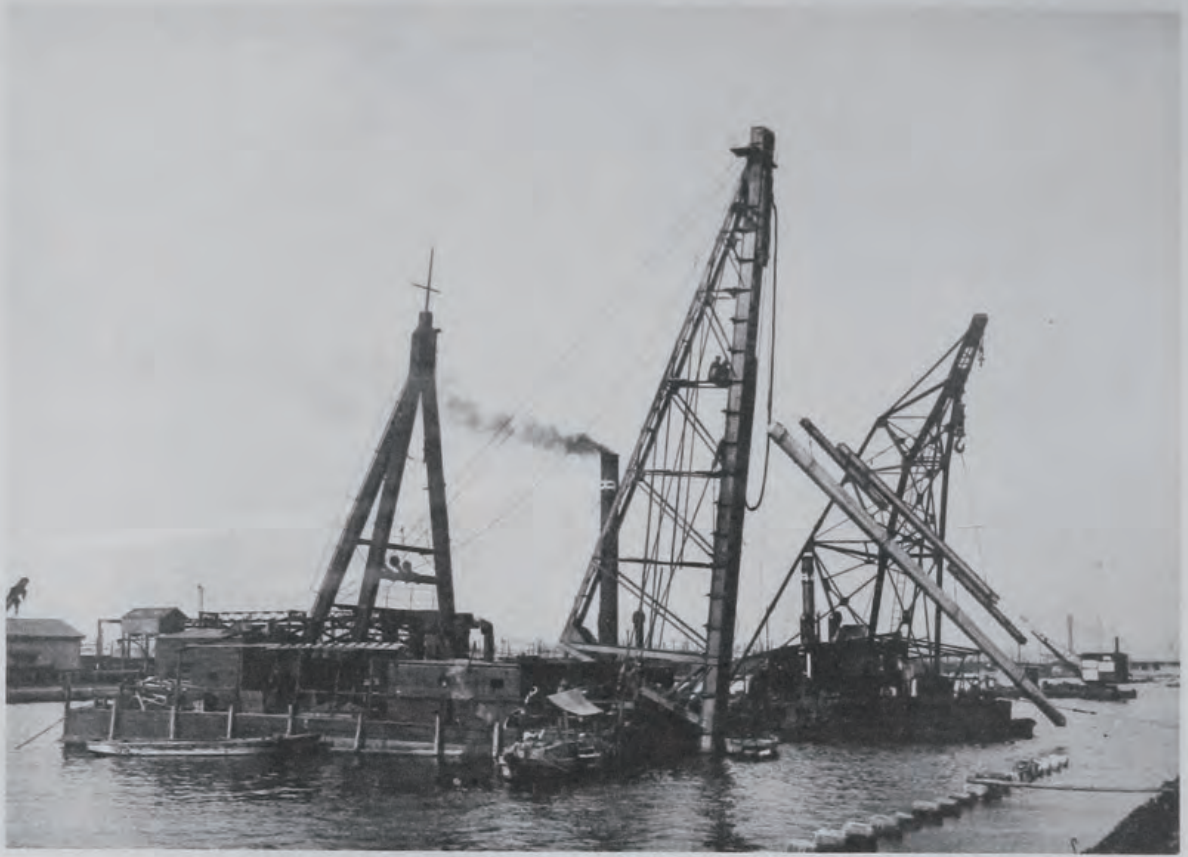

(23) 横濱港修築工事表高島町物揚場杭打作業
鐵筋混凝土杭長十九米、斷面五十糎×三十糎



(24) 神戶港修築工事兵庫第二突堤




(25)

鹿兒島港修築工事南防波堤
延長四百五十米、場所詰混凝土
頂部ハ平均朔望満潮面上一米五

(26)

相模川流域震災復舊砂防工事長者堰堤
(神奈川県愛甲郡富ヶ瀬村地先)
相模川右支中津川ニアリ、長二十三米、高十二米

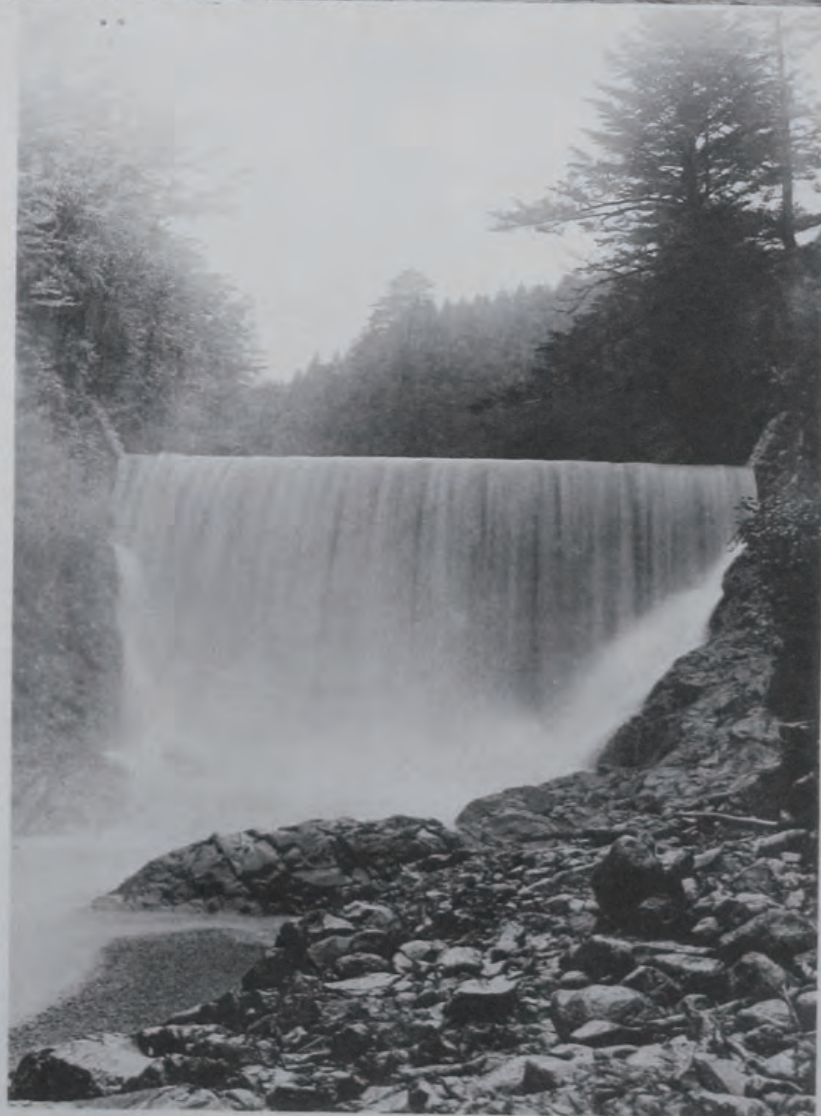




(27) 信濃川補修工事可動堰
(新潟縣三島郡大河津村大字川津地先)



(28) 信濃川補修工事固定堰
(新潟縣三島郡大河津村大字川津地先)

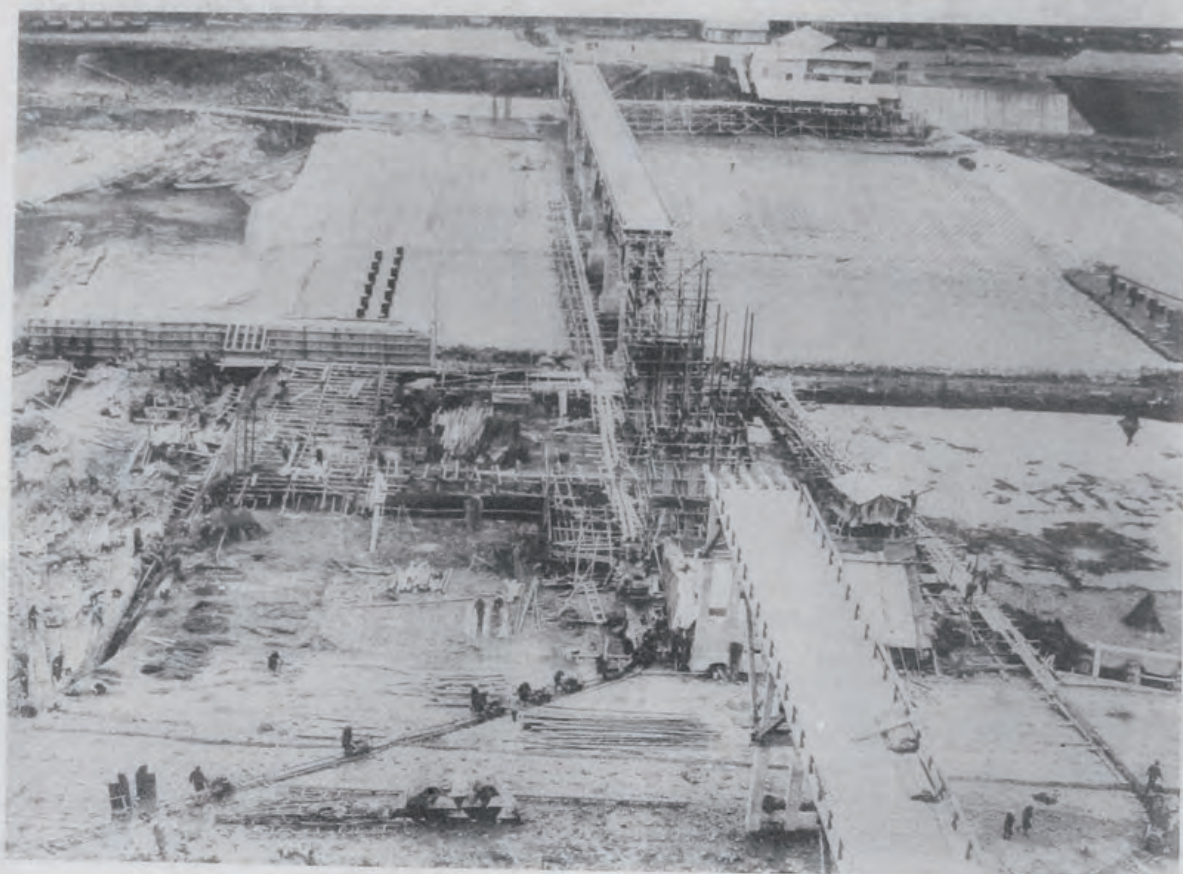

(29) 信濃川補修工事第二床固
(新潟縣西蒲原郡國上村字渡部地先)



(30) 信濃川補修工事第二床固阻柱
(新潟縣西蒲原郡國上村字渡部地先)
昭和六年三月二十一日出水狀況
